МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский технологический колледж»
(ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»)

Кремлёвская ул., д. 22, Йошкар-Ола,
Республика Марий Эл, 424000
Тел./факс: 8 (8362) 45-07-36. Бух: 8 (8362) 45-02-34
E-mail: yotk@mari-el.gov.ru

01.09.2026 г. № 01-490
На вх № 1451 от 25.05.2026___
На исх № ___ от _____

Начальнику
отдела надзорной деятельности и
профилактической работы ГО
«Город Йошкар-Ола» управления
надзорной деятельности и
профилактической работы
ГУ МЧС России по Республике
Марий Эл
Ямбашеву С.Е.

ОТВЕТ НА ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

Настоящим сообщаем, что по результатам профилактического визита, проведённого на основании решения от 08.05.2026 г. № 2605/002-12/54-ВО/Р (учётный номер проверки: 12260061000221659378), были выявлены нарушения, зафиксированные в акте проверки и отражённые в предписании. По состоянию на 01.09.2026 все указанные в предписании нарушения устранены полностью. Работы выполнены в установленные сроки и надлежащим образом. Перечень выполненных работ:

1. На пятом этаже в лестничной клетке пожарный кран укомплектован пожарным запорным клапаном («барашком»), пожарный рукав присоединён к крану *(Приложение 1)*.

2. В комнатах № 62, 66, 71 произведена замена горючих потолочных материалов (пропиленовых плит) на негорючие с предоставлением соответствующей документации (сертификатов пожарной опасности). *(Приложение 2)*.

3. Помещение архива на первом этаже с категорией В2 выделено противопожарными преградами в соответствии с п. 5.1.2 СП 4.13130: установлены противопожарные перегородки 1-го типа и противопожарная дверь. Нарушения требований *ФЗ № 123-ФЗ* (ст. 6 ч. 1; ст. 4 ч. 4; ст. 88 ч. 1) и *СП 4.13130 (п. 5.2.6)* устранены. *(Приложение 3)*.

4. Складское помещение № 13 с категорией В2 выделено противопожарными преградами в соответствии с п. 5.1.2 СП 4.13130: установлены противопожарные перегородки 1-го типа и противопожарная дверь. Нарушения требований *ФЗ № 123-ФЗ* (ст. 6 ч. 1; ст. 4 ч. 4; ст. 88 ч. 1) и *СП 4.13130 (п. 5.2.6)* устранены. *(Приложение 4)*.

5. На фасаде здания установлено обозначение направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения с помощью светоотражающих или подключённых к электроснабжению световых указателей. *(Приложение 5).*

6. В спальных помещениях 4 и 5 этажей выполнена замена неисправных оповещателей (громкоговорителей). Система оповещения находится в работоспособном состоянии *(Приложение 8).*

7. Заведён и ведётся журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. *(Приложение 7).*

8. Организована запись всех событий, включая ложные срабатывания автоматической пожарной сигнализации (АПС), в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Нарушение *п. 6.5.4 ГОСТ Р 59638-2021* устранено. *(Приложение 8).*

9. Проведена диагностика АПС, выполнены настройки для снижения частоты ложных срабатываний до нормативных значений. Нарушение требований раздела 6.5 *ГОСТ Р 59638-2021* и *ФЗ № 123-ФЗ* устранено. *(Приложение 8).*

10. В комнате № 76 нестандартные удлинители демонтированы, используется сертифицированное электрооборудование. *(Приложение 10).*

11. Выполнена прокладка открытой электропроводки по горючему основанию с использованием средств дополнительной защиты (кабель-каналов, гофротруб из негорючих материалов).

12. На противопожарную дверь складского помещения для хранения белья установлен доводчик (устройство для самозакрывания). Гарантируем дальнейшее соблюдение требований законодательства и принимаем меры по недопущению повторения аналогичных нарушений. *(Приложение 12).*

Приложения: фотоматериалы, подтверждающие устранение нарушений — на 9 л.

Директор Ю.В. Луков

Уласова Галина Александровна
41-09-01

Приложение 1



Приложение 2







Приложение 3




Приложение 4



Приложение 5



Приложение 7

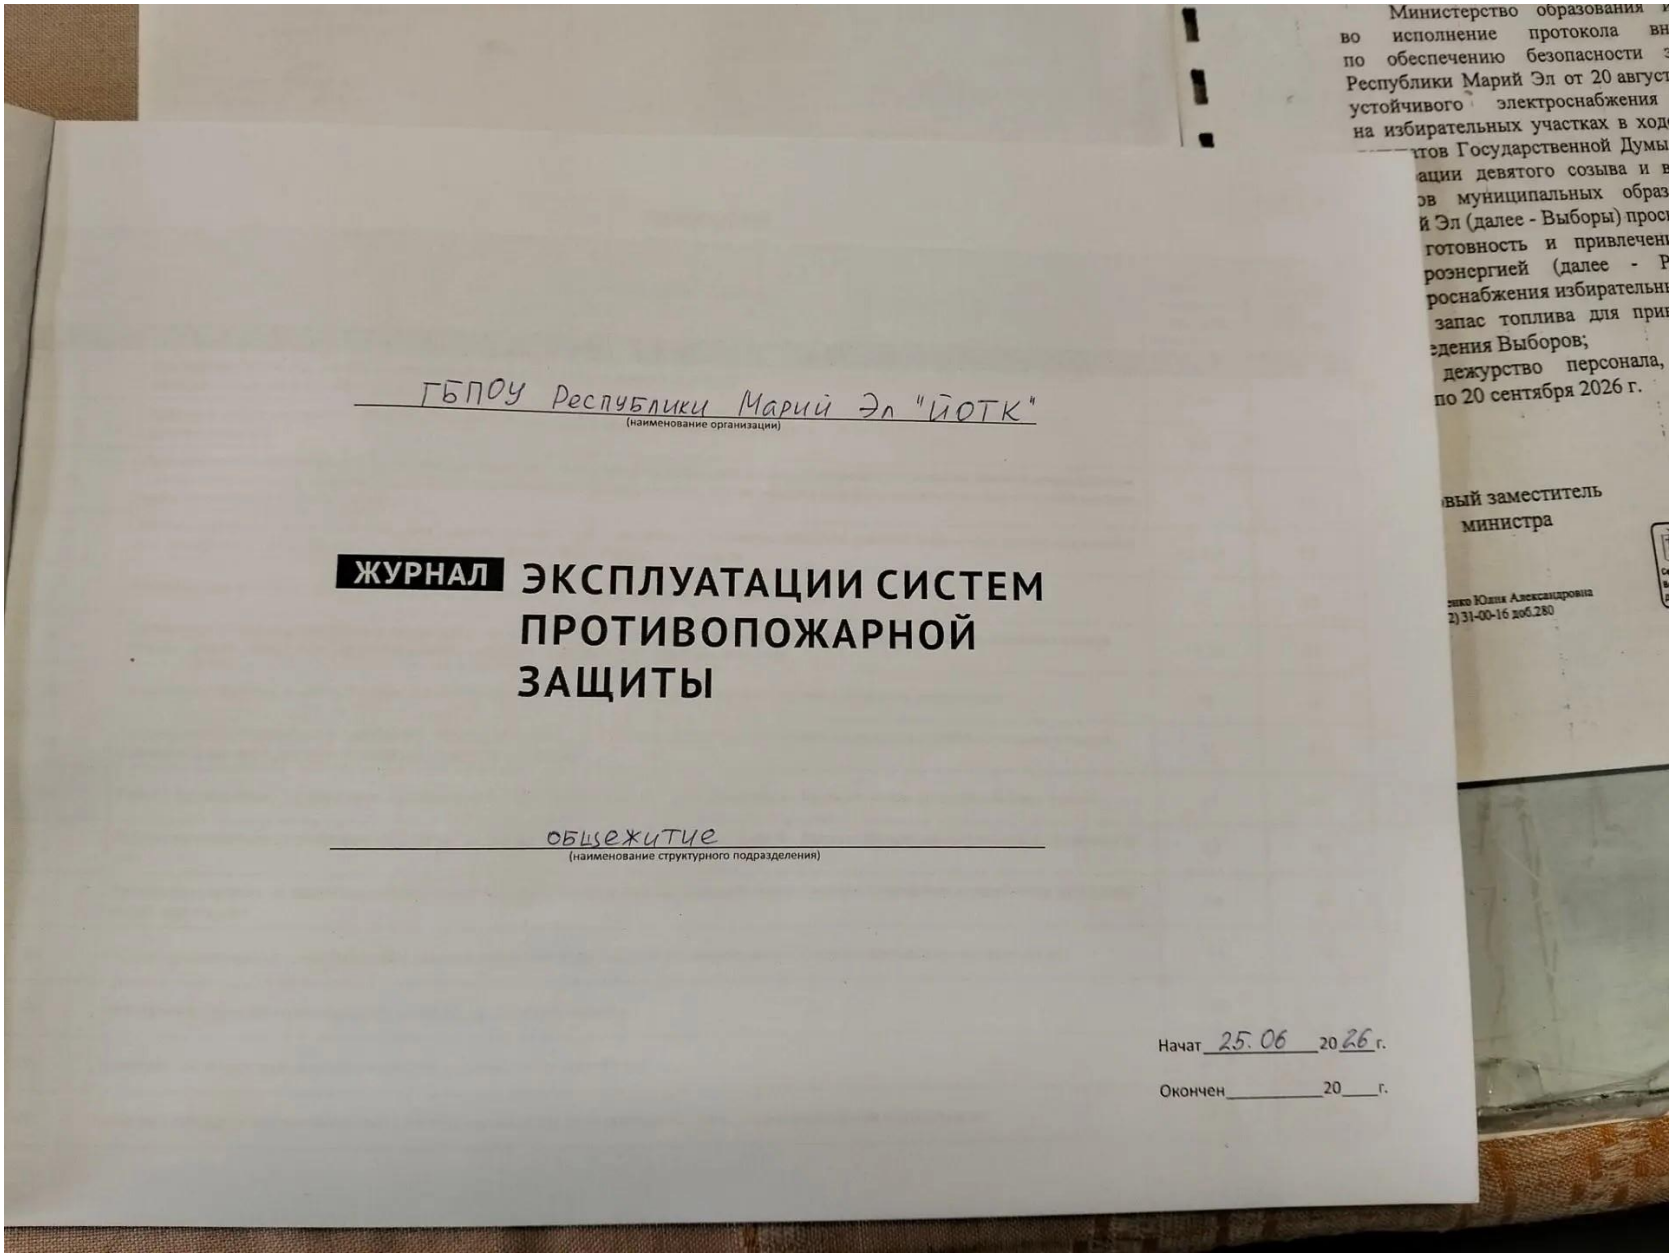

ГБПОУ Республики Марий Эл "ЙОТК"
(наименование организации)

ЖУРНАЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

общежитие
(наименование структурного подразделения)

Начат 25.06 2026 г.

Окончен _____ 20____ г.

Министерство образования
во исполнение протокола
по обеспечению безопасности
Республики Марий Эл от 20 август
устойчивого электроснабжения
на избирательных участках в ход
атов Государственной Думы
ации девятого созыва и
ов муниципальных образ
й Эл (далее - Выборы) прос
готовность и привлечен
роэнергией (далее -
роснабжения избирательн
запас топлива для при
едения Выборов;
дежурство персонала,
по 20 сентября 2026 г.

вый заместитель
министра

нко Юлия Александровна
2) 31-00-16 доб.280

Приложение 8

А К Т
выполненных работ по техническому обслуживанию
систем безопасности

Представителем МРО ВДПО Тюлькиным А.В.
на объекте: Здание общежития Йошкар-Олинского технологического колледжа
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Кремлёвсая, д.24

В ходе выполнения работ проведены:
1. Контрольно-профилактический осмотр системы пожарной сигнализации и речевой системы оповещения
2. Проведение ремонта системы СОУЭ:
- обрыв линии речевого оповещения о пожаре на 5 этаже здания. Устранено.
- замена неисправного аккумулятора 12В 7А/ч в приборе речевого оповещения «Соната К-Л» на 5 этаже здания.
Устранено.
3. Проверка работоспособности ПАК "Стрелец-Мониторинг" совместно с пультом централизованного наблюдения.

Объемы, содержание и порядок выполнения работ по техническому обслуживанию соответствуют технической документации.
Выполнение работы отражены в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту средств охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения».

Выявленные на объекте недостатки:
_____
Замечания, предложения по улучшению работы «Комплекса» ТСО:
_____


Остальные технические средства находятся в работоспособном состоянии и пригодны для дальнейшей эксплуатации, претензий по выполнению работ нет.

Представитель МРО ВДПО _____ / Тюлькин А.В.

Представитель Заказчика:
_____ Ушаков П. зав. обу. (должность)
(подпись) (расшифровка подписи)

«28» 08 2026 г.

Приложение 10

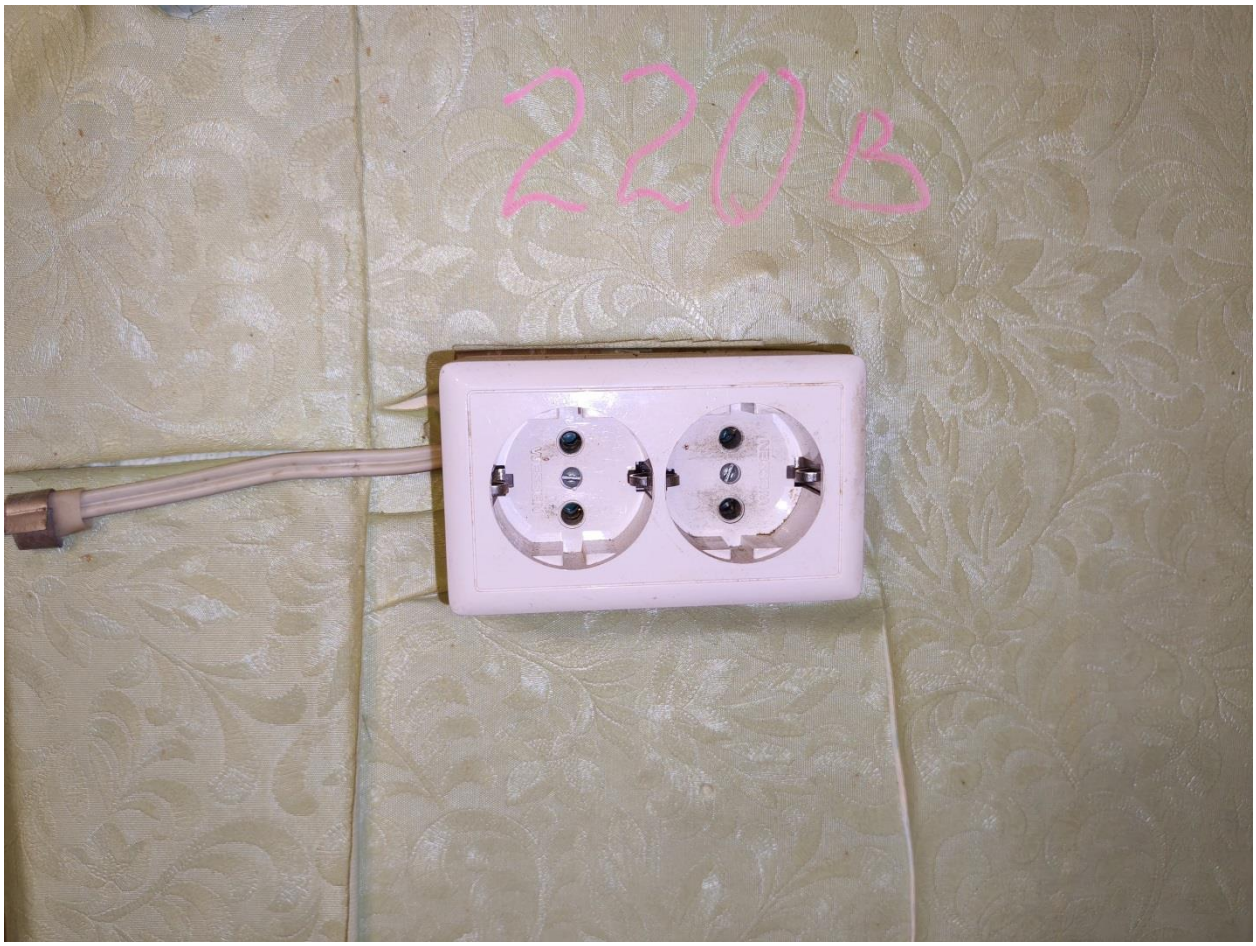

Приложение 12

